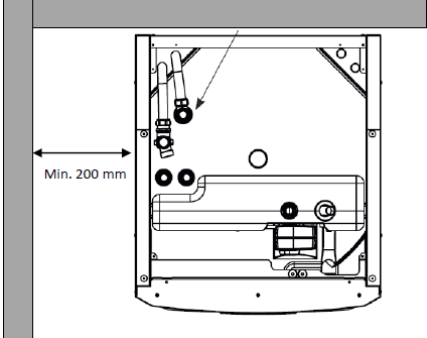
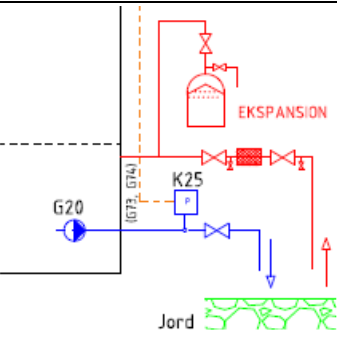




Checkliste CTC jordvarmepumpe installation.

CTC EcoHeat 400, EcoPart 400 og 600 M, GS og GSi.

VVS installation kontrolpunkter	
Varmepumpe <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Varmepumpe opstillet vandret og på stabilt underlag <input type="checkbox"/> 1 m fri foran produktet af hensyn til service <input type="checkbox"/> 20 cm fri på venstre side af produktet (EcoHeat 400 og EcoZenith 255) 	
Brinekreds <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Skumsvamp benyttet og brinekreds gennemskyllet <input type="checkbox"/> Jordvarmeslanger trykprøvet og attest udfyldt <input type="checkbox"/> Brinekreds påfyldt blanding af vand og IPA sprit <input type="checkbox"/> Kredsen udluftet og tryk på 1,5 bar <input type="checkbox"/> Påfyldningsaggregat monteret på brine ind og således at filter kan renses. <input type="checkbox"/> Afspærringsventil monteret på brine ud <input type="checkbox"/> Brine sikkerhedspressostat monteret <input type="checkbox"/> Brinerør isoleret 	
Varmeanlæg <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anlægsopbygning som foreskrevet <input type="checkbox"/> Anlægspumpe monteret på fremløb til varmeanlæg (EcoHeat 400, EcoZenith 255 og 555) <input type="checkbox"/> Automatisk udluftning monteret på højeste punkter <input type="checkbox"/> Overstrømsventil monteret (GS, GSi og EcoZenith 360) <input type="checkbox"/> Tank og varmeanlæg påfyldt vand og udluftet, tryk på 1,5 bar <input type="checkbox"/> Snavssamler monteret på retur fra varmeanlæg til unit <input type="checkbox"/> Sikkerhedsventilers overløb ført til afløb 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>EH 400 / EZ 255</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EcoZenith 555</p> </div> </div>
El installation kontrolpunkter	
Varmepumpe <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 400 V tilgang monteret korrekt (afbryder eller stik på tilgang) <input type="checkbox"/> Sikrings størrelse som foreskrevet <input type="checkbox"/> Bimåler monteret (krav fra BR 18, hvis beregnet forbrug >3000 kWh) <input type="checkbox"/> Fejlstrømsrelæ HPFI type B anvendt (GSi og EP 600 M) <input type="checkbox"/> Eksterne pumper og ventiler forbundet ifølge el diagram (anlægspumpe, skifte- og shuntventiler og evt. spidsvarme) <input type="checkbox"/> Eksterne følere forbundet ifølge el diagram (fremløbs-, ude-, retur- og systemfølere) 	
